




① 束石（現場ご手配）の上に土台を組む。

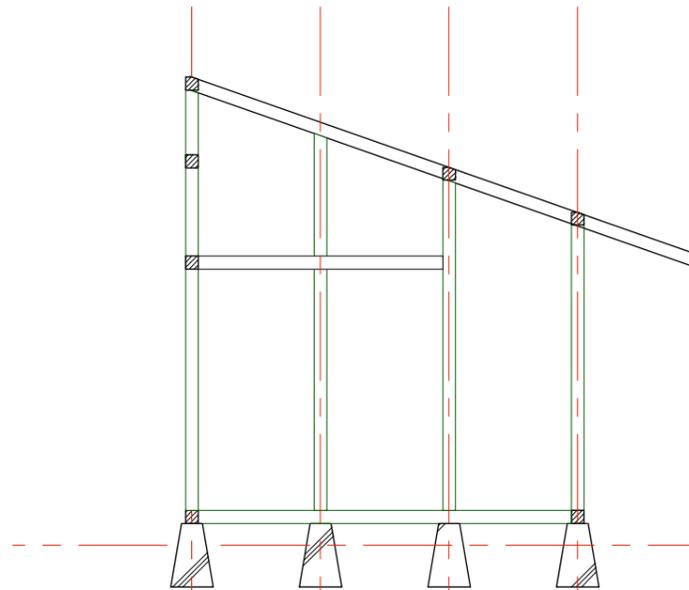


② 土台の上に柱を入れ込み、梁を組む。

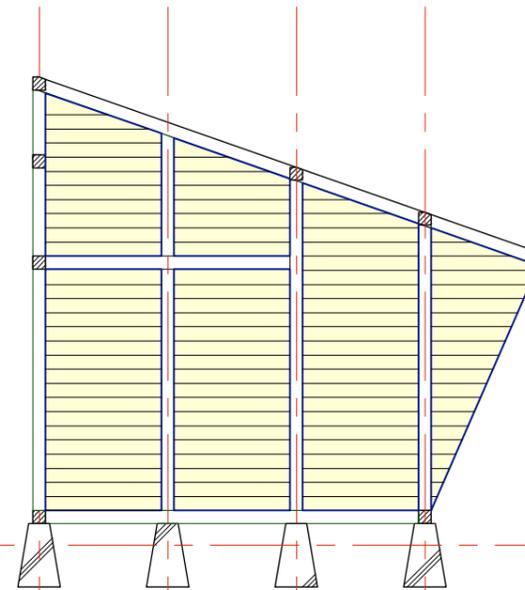


③ 壁パネル（黄色の部分）を柱の間に挟み込み、柱にビスで固定する。

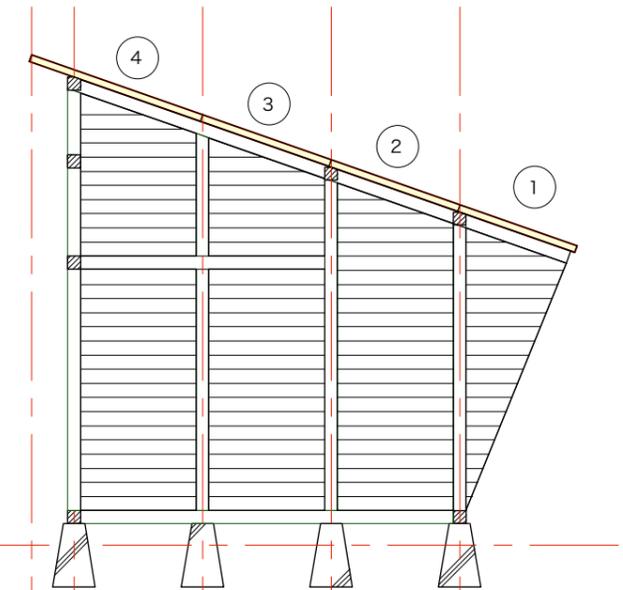


④ 屋根パネルを乗せて、ビスで固定する。

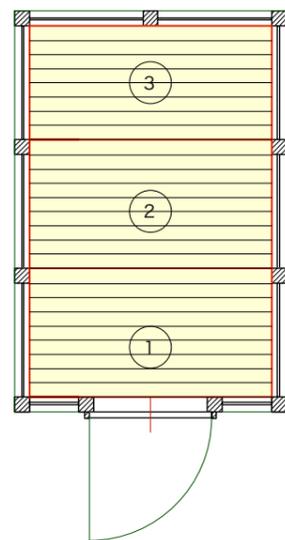


⑤ 床パネルを土台の上に乘せてビスで固定する。

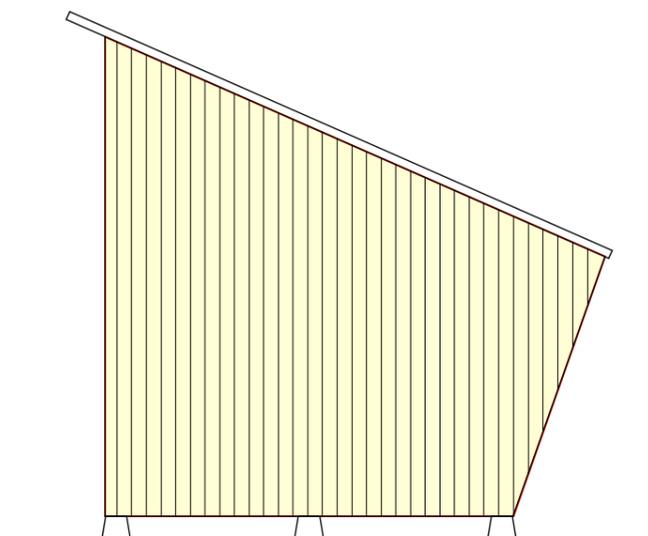

⑥ 外壁の板を貼る。（板は一枚ずつ貼ります）

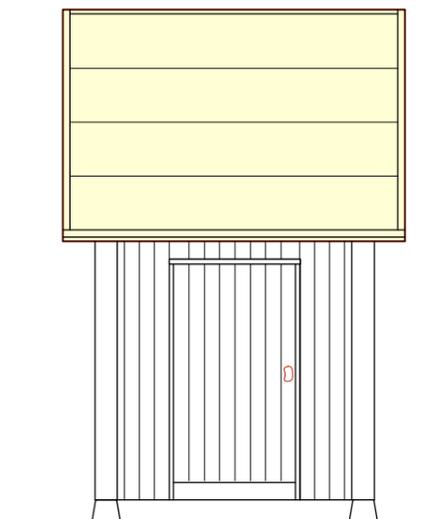

⑦ 屋根のガルバリウムを貼る。（一枚ずつ貼ります）

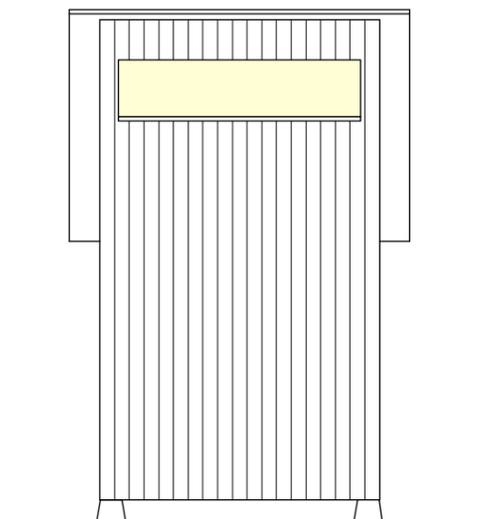

⑧ ガラスを枠に入れて、付属の押縁で固定する。
*コーキングは現場ご手配。

注意事項

- ・ 構造材、仕上げの木材は天然木材を使用しております。反りや割れ等が生じることがあります。
- ・ 高所作業の際は十分お気をつけ下さい。
- ・ 木材は経年変化によって変色します。湿気が多い場所は腐食が早くなる場合があります。状況や使用目的に応じて木材防腐塗料を塗ることをお勧めします。
- ・ 作業目安は、大工2人で2～3日です。
- ・ 基礎の束石等は現場手配にてお願い致します。基礎部分の水平がとれていない場合は、パネルがはまらない、構造材がねじれる等の不具合が生じますので、お気をつけ下さい。
